



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA:
06 . 10 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:


- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.2.

Informe de resultados y conclusiones Sprint 4

Contenido

	Página
<u>1.</u> Informe de resultados	2
<u>2.</u> Conclusiones	4
Referencias	5



1. Informe de resultados.

En el Sprint 4 se completaron las historias **H9.1–H9.5 (Afiliados)** y **H10.1–H10.4 (Reporte PDF)**, para un total de **24 puntos de historia**. El incremento habilita dos capacidades visibles para el usuario:

- **Botón “Comprar”** por producto con **registro de clic** asociado a **usuario–producto–proveedor–URL–timestamp**.
- **Descarga de reporte en PDF** desde el flujo principal, con **título, fecha y totales** coherentes con la tabla.
- Adicionalmente, se simplificó la navegación dejando **“Subir lista”** como punto de inicio (home) → (flujo unificado: *Subir* → *Comparar* → *Comprar/Descargar*).

Nota: Las tareas de **Afiliados (H9.1–H9.5)** aparecen en este sprint como **reprogramadas desde Sprint 3** (indicadas en la columna *Estado*). El paquete de **Suscripciones (H11.1–H11.7)** no figura en **Sprint 4** porque se **movió al Sprint 5**, con el fin de concentrar este incremento en **Afiliados + PDF**.


Aportaciones del equipo Scrum:

Luis Enrique — Product Owner (PO)

- Definió **criterios de aceptación** para Afiliados y PDF:
 - Afiliados: redirección correcta por proveedor; registro del clic con **usuario–producto–proveedor–URL–timestamp**; sin pasos extra en la navegación.
 - PDF: encabezado con nombre del reporte y **fecha**; **total igual** a la sumatoria de la tabla.
- **Decisiones de alcance:** aprobó concentrar Sprint 4 en **H9 + H10** y mover **H11** al Sprint 5.
- **Validación funcional** (demo): probó 5 casos de compra (proveedores distintos, URL válida/ inválida) y 3 descargas de PDF (listas- corta/media/larga), **aceptando** el incremento.

Alicia — Scrum Master (SM)

- Organizó el trabajo del **02–06 de octubre** con 2 hitos: kickoff y demo/retro, y seguimiento asíncrono diario.



- **Desbloqueó fricciones** de build en Windows y acordó como política (próximo sprint) **scripts portables**.
- Llevó **micro-burndown** (24→18→12→6→0), checklist de evidencias (capturas, PRs) y condujo la **retro** con contramedidas para el siguiente sprint (lista blanca de dominios, deduplicación de clics, pruebas básicas automáticas).

Eduardo Alejandro — Developer (Frontend)


- **Comparador (UI)**: integró el botón “**Comprar**” por producto con manejador logAffiliateClick, estado deshabilitado durante el registro y **mensaje de confirmación**.
- **Flujo unificado**: reorganizó la navegación para completar **Subir → Comparar → Comprar/Descargar** en la misma vista.
- **Reporte PDF**: implementó generación con **jsPDF + autoTable**, formateo de **moneda/fecha**, verificación de **totales**, y botón “**Descargar PDF**” en la interfaz.
- Entregó **evidencia UI**: capturas del flujo completo y ejemplos de PDF con listas de distinto tamaño.

Luis Yasmani Fajardo Durán — Developer (Backend)


- **Tracking de afiliados**: implementó el servicio para registrar clics con **usuario–producto–proveedor–URL–timestamp**, validaciones de entrada y **índices** para consulta.
- **Datos para PDF**: garantizó totales consistentes desde el backend y soporte para listas medianas.
- **Pruebas técnicas**: validó registro de clics (URL válida/inválida) y coherencia de totales con cliente HTTP; dejó **evidencia** en PRs del sprint.

Resultados alcanzados:

- **Afiliados operando**: cada producto muestra “Comprar”; se **registra el clic** por usuario–producto–proveedor con URL y timestamp.
- **Reporte PDF** disponible desde el flujo principal, con **título, fecha y totales** coherentes con la tabla.
- **Flujo unificado** que reduce pasos y confusión (inicio en “**Subir lista**”).




- **Alcance cumplido: 24/24 puntos** de historia aceptados por el PO.

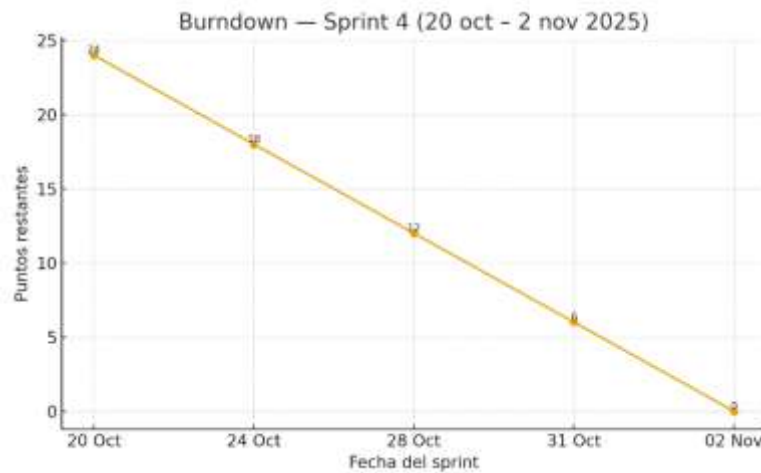

2. Conclusiones

El Sprint 4 consolidó el uso real de la herramienta: el flujo quedó claro de principio a fin y el usuario ahora puede **comparar, decidir y ejecutar** (comprar o descargar su reporte) sin pasos extra. La integración de afiliados y la exportación a PDF no solo aportan valor visible; también dejan una base medible para evaluar adopción y conversión en los siguientes sprints.

Operativamente, el equipo respondió bien a una ventana corta: priorizó, evitó dispersión y cerró el alcance comprometido. Las fricciones detectadas (build en Windows y validación de clics) se transformaron en acuerdos concretos para el siguiente ciclo, sin afectar el cierre. Con ello, quedamos **listos para escalar**: estandarizar el reporte, reforzar la calidad con pruebas mínimas y habilitar métricas que permitan decidir con datos. En suma, el producto avanza con **claridad de flujo, evidencia de valor y dirección técnica** para el Sprint 5.



Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

