



LICENCIATURA EN DESARROLLO DE
SISTEMAS WEB.

MATERIA | PROYECTO VII

UNIDAD 3. DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOTIPO

NOMBRE DEL PROYECTO.

MI LISTA INTELIGENTE

FECHA DE ENTREGA:
15 . 10 . 2025

Asesor: Sergio Ulises Lillingston Perez

Equipo Scrum:


- Luis Enrique Ricaño Patiño – 222958984 (Product Owner)
- Bertha Alicia Ortega Ruiz – 303653994 (Scrum Master)
- Eduardo Alejandro Juárez Jiménez – 217404571 (Developer)
- Luis Yasmani Fajardo Durán – 222958771 (Developer)

Actividad 3.3.

Informe de resultados y conclusiones Sprint 5

Contenido

	Página
<u>1.</u> Informe de resultados	2
<u>2.</u> Conclusiones	4
Referencias	5



1. Informe de resultados.

En el Sprint 5 se completaron las historias **H11.1–H11.3, H11.5–H11.7** (Suscripciones) y **H12.1–H12.3** (Carga masiva). El incremento habilita dos capacidades visibles:

- **Planes de suscripción operativos** (Gratis, Premium, B2B) con restricciones por plan y UI de administración/activación.
- **Carga masiva de artículos** desde Excel/CSV con validación básica y consolidación en la lista.

Nota: H11.4 (pagos) y H12.4–H12.10 (colaboración/roles/permisos/compartir + pruebas/demo) fueron **reprogramadas al Sprint 6** para asegurar un incremento demostrable y estable en este sprint.

Aportaciones del equipo Scrum:

Luis Enrique — Product Owner (PO)


- Definió criterios de aceptación para Suscripciones (planes, restricciones y visibilidad en la UI).
- Decisión de alcance: concentrar S5 en **H11 (sin pagos) + H12.1–H12.3**, moviendo pagos y colaboración a S6.
- Validación funcional (demo): revisó activación por plan y prueba de importación de listas; **aceptó** las historias.

Alicia — Scrum Master (SM)

- Planificó la iteración y condujo seguimiento asíncrono diario.
- Facilitó la replanificación de mitad de sprint (descarta pagos/colaboración) para preservar el incremento.
- Mantuvo **micro-burndown** y checklist de evidencias por historia (capturas/PR).

Eduardo Alejandro — Developer (Frontend)

- UI de planes (selección/activación) y mensajes de restricción según plan.
- Interfaz de **importación Excel/CSV** con validaciones básicas y feedback al usuario.
- Evidencia UI: capturas del flujo y listas importadas.



Luis Yasmani Fajardo Durán — Developer (Backend)

- Reglas de negocio de **Suscripciones** (planes y restricciones) y persistencia.
- Endpoints/servicios para **carga masiva** y consolidación de datos.
- Pruebas técnicas y evidencias en PRs del sprint.


Resultados alcanzados:

Suscripciones operativas con planes diferenciados y restricciones aplicadas en la UI.

Carga masiva funcionando con validación básica y consolidación en la lista.

Incremento demostrable y aceptado por el PO.

Reprogramación controlada: pagos y colaboración pasan a Sprint 6 con plan de ejecución secuencial.

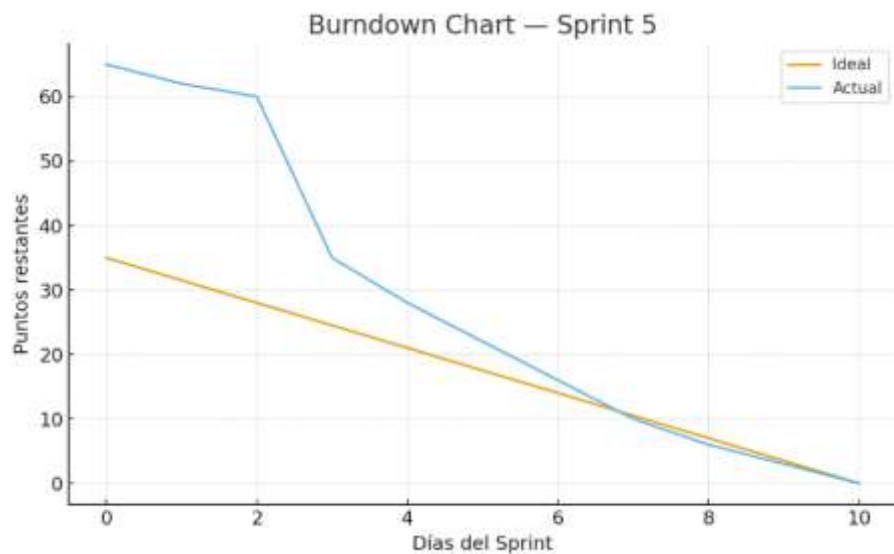


El equipo inició con un alcance preliminar de **65 pts** y, tras la replanificación de mitad de sprint, ajustó el compromiso a **35 pts** (entregados al 100%). La gráfica refleja la **reducción de alcance (Día 3)** y el **burn** estable hasta **0**.

2. Conclusiones

El Sprint 5 se cumplió de forma parcial pero satisfactoria: se entregaron y aceptaron por el PO las historias de Suscripciones (H11.1–H11.3, H11.5–H11.7) y Carga masiva (H12.1–H12.3), consolidando un incremento funcional y demostrable. A mitad de iteración se ajustó el alcance para proteger la calidad del incremento, **reprogramando H11.4 (pagos) y H12.4–H12.10 (colaboración) al Sprint 6**. El burndown refleja la decisión de recorte y una quema constante posterior hasta completar el compromiso.

Como aprendizaje, se formaliza un checklist de “listo para desarrollar” (spike temprano en integraciones de terceros, plantilla/validador de CSV y criterios Given/When/Then por historia) y la evidencia de aceptación estandarizada por ID para fortalecer trazabilidad. El equipo queda preparado para el Sprint 6 con un plan secuenciado para pagos y colaboración, manteniendo la cadencia y reduciendo riesgos en la siguiente entrega.



Referencias

Atlassian. (s. f.). *Métricas de Scrum*. Atlassian.

<https://www.atlassian.com/es/agile/scrum/scrum-metrics>

Comparasoftware. (2021, mayo 6). *Cuáles son los Documentos Entregables SCRUM*. ComparaSoftware Blog.

<https://blog.comparasoftware.com/cuales-son-los-documentos-entregables-scrum/>

Pérez, A. (2021, abril 25). *Las 5 etapas en los “Sprints” de un desarrollo Scrum*.

OBS Business School. <https://www.obsbusiness.school/blog/las-5-etapas-en-los-sprints-de-un-desarrollo-scrum>

